Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	365 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI	31 g
DEMOLIZIONI E TAGLI	9 g
Demolizione di pareti divisorie	1 g
Demolizione di solaio in c.a.	2 g
Demolizione di tompagnature	1 g
Demolizione generale di murature portanti eseguita con	3 g
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con irr	3 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	1 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI	22 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in	1 g
Rimozione di impianti	1 g
Rimozione di pavimenti interni	9 g
Rimozione di serramenti esterni	1 g
IMPIANTI	120 g
Posa macchina di condizionamento	9 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto	6 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an	6 g
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	19 g
Realizzazione di impianto antintrusione	32 g
Realizzazione di impianto ascensore	15 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	48 g
OPERE IN FACCIATA	137 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	9 g
Posa di serramenti esterni	5 g
Realizzazione di tompagnature	8 g
Tinteggiatura di superfici esterne	11 g
OPERE INTERNE	195 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	1 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	25 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	59 g
Posa di pavimenti per interni	35 g
Posa di rivestimenti interni	19 g
Posa di serramenti interni	5 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	25 g
Realizzazione di divisori interni	10 g
Tinteggiatura di superfici interne	14 g
OPERE STRUTTURALI	78 g
ACCIAIO	5 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	5 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	5 g
CEMENTO ARMATO	63 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in e	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o	3 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondau	14 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	29 g
MURATURA	7 g
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in	2 g
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in eleva	4 g
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	167 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	1 g
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	5 g
Perforazioni in elementi opachi	1 g
Realizzazione di un foro nel solaio	4 g
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICH	70 g
OPERE DI SOSTEGNO	15 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn	9 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in	12 g
SCAVI E RINTERRI	70 g
Rinterro di scavo	5 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione ristretta	1 g
Scavo di sbancamento	2 g
Scavo eseguito a mano	1 g

LEGENDA Zona:
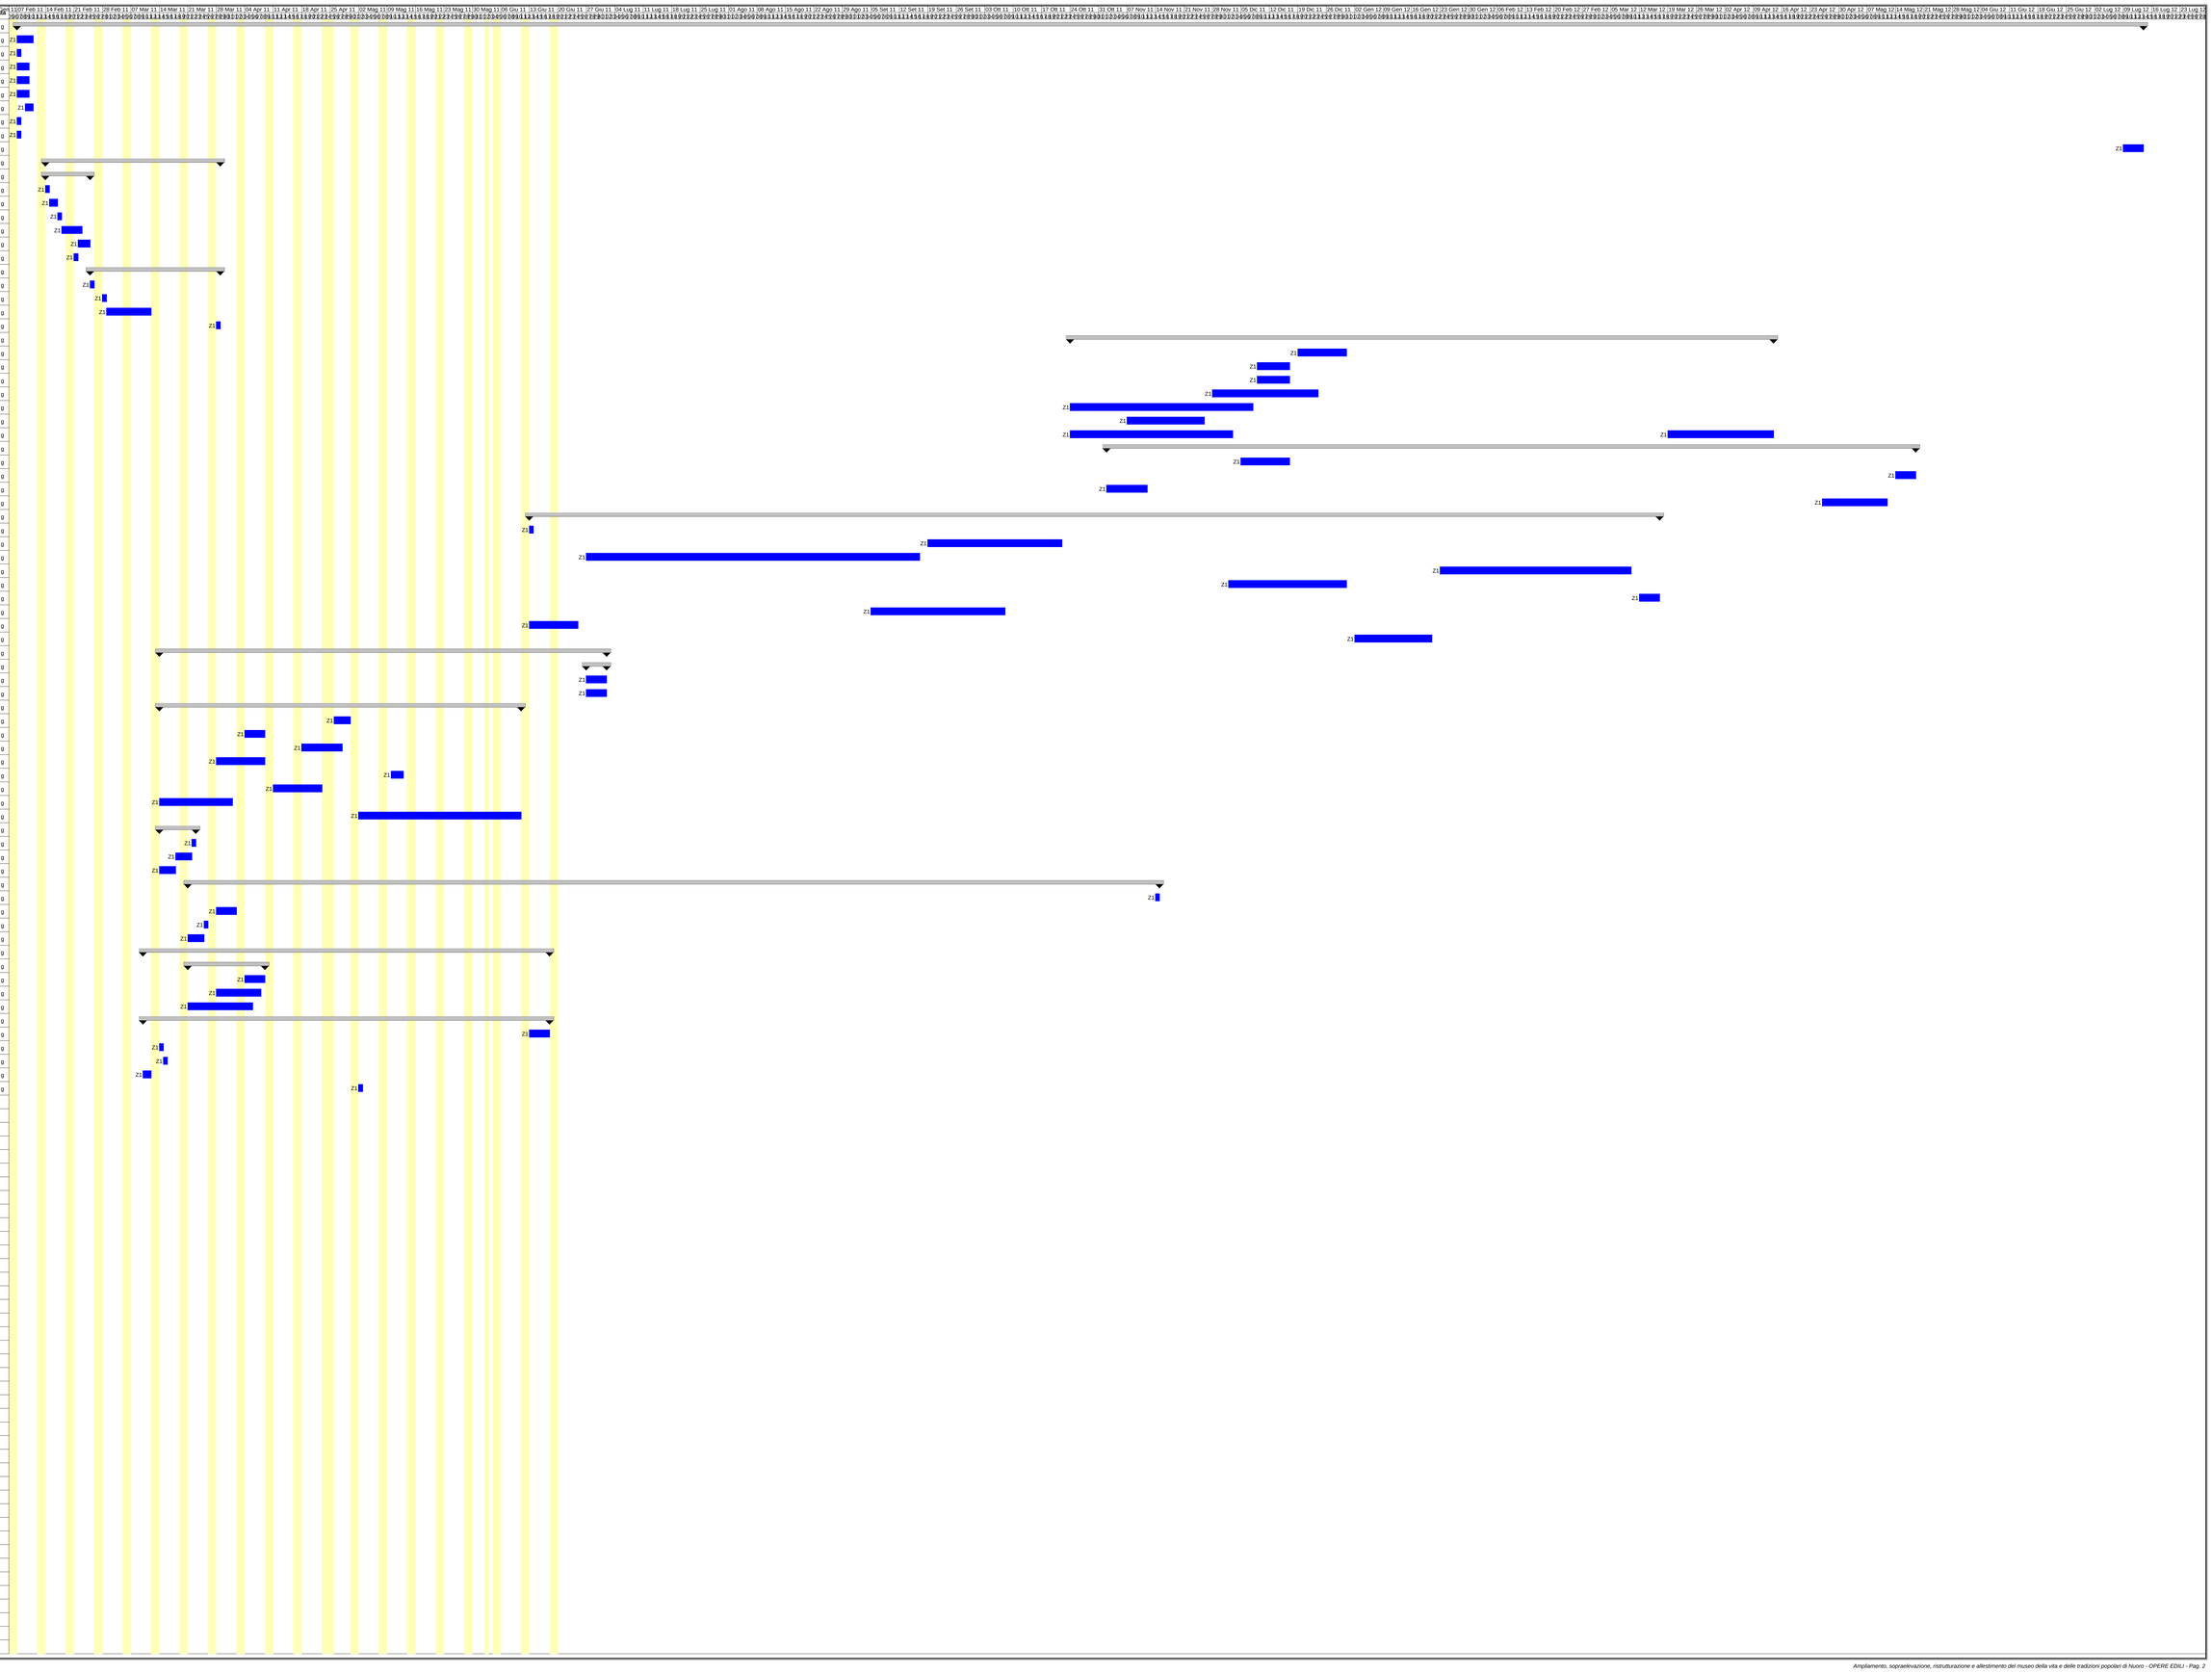
Z1 = ZONA UNICA
